

<https://migale.fr/telechargements/>

Visite SH du 16 Janvier 2023 en présence de Erwan, du soliste et des clients


Les cloisons amovibles devront répondre à une performance acoustique de ~45db - Le maçon OYAMBURU va nous confirmer que la chape est bien saignable et confirmé par le syndic

Intégration d'un PF1 Ghe T. dans une structure mur rideaux - Dimension clair de jour (niche) 2352 x 1156 -

Montants Epine en saillie intérieure de ~108mm de la face intérieure vitrage, épaisseur 55mm - Vitrage 4/20/4

à déposer de l'extérieur par les profils serreurs - Alu existant Technal - Ral approchant 1019 - Crémone simple

- Vtl ouvrant 75mm avec vitrage clair 4/20/4 - Dos de dormant 2345 x 1146

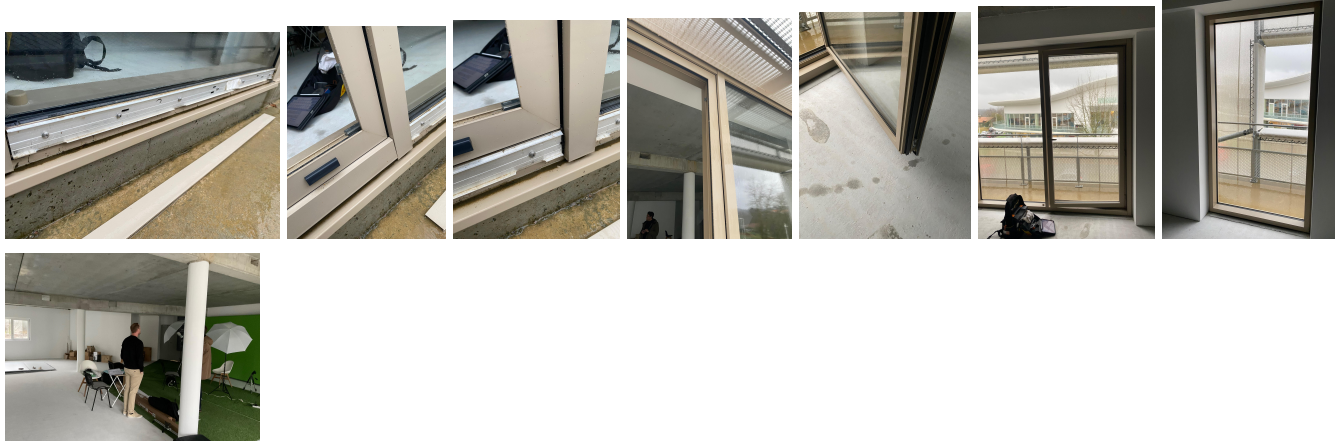

Rapport EM 25/04/23:

Merci de recommander l'ouvrant reçu rayé sous emballage



Rapport EM 25/04/23:

Merci de recommander l'ouvrant reçu rayé sous emballage

ATTENTION : merci de nous confirmer qu'on peut déparcloser facilement sans abîmer les parclores. Si oui, on commande l'ouvrant non vitré. Le client final est hyper exigeant, si c'est compliqué, merci de refaire l'ouvrant vitré en gratuit svp ***
